World Vision | EDITION for everyone's protection

총 사업기간 · 2026년 3월 ~ 12월 (10개월)

노스페이스 에디션과 함께 만들어가는 특별한 변화

2026 인도네시아 티모르지역 식수위생 지원사업

동누사텡가라(East Nusa Tenggara)주 남중부 티모르(South Central Timor) 아마누반텡가(Amanuban Tengah)구 보네 오에투네(Bone-Oetune) 마을

사업 목표

티모르지역 아동의 건강한 성장을 위해 깨끗한 물에 대한 접근성을 높인다.



총 수혜 대상

6,275명

직접수혜자 653명 + 간접수혜자 5,622명

26년 11월 확인 · [2]

식수 시설 건설

3기

식수 탱크, 태양광 패널, 식수 펌프

26년 9월 기준 · [1]

위생 교육을 받은 마을 지도자

62명

지역 마을 지도자

26년 9월 기준 · [1]

01 · 사업 개요

깨끗한 물이 닿지 않는 마을에 식수 시설을 놓습니다

심각한 물 부족과 열악한 위생 인프라로 아동과 지역 주민의 건강이 위협받고 있습니다. [1]

사업명	인도네시아 티모르지역 식수위생 지원사업
사업 기간	2026년 3월 ~ 12월 (10개월)
사업 지역	인도네시아 동누사텡가라(East Nusa Tenggara)주 남중부 티모르(South Central Timor) 아마누반텡가(Amanuban Tengah)구 보네 오에투네(Bone-Oetune) 마을
사업 목표	티모르지역 아동의 건강한 성장을 위해 깨끗한 물에 대한 접근성을 높인다.

총 수혜 대상

6,275 명

● **직접 653명** ● 간접 5,622명

26년 11월 확인 [2]

● **직접 수혜 대상**


653 명

아동 319명 · 지역주민 334명

여아	197
남아	122
지역주민 여성	133
지역주민 남성	201

● 아동 ● 지역주민 사업 계획 기준 [1]

① **인도네시아 안의 사업지역** 동누사텡가라주 티모르섬 남중부

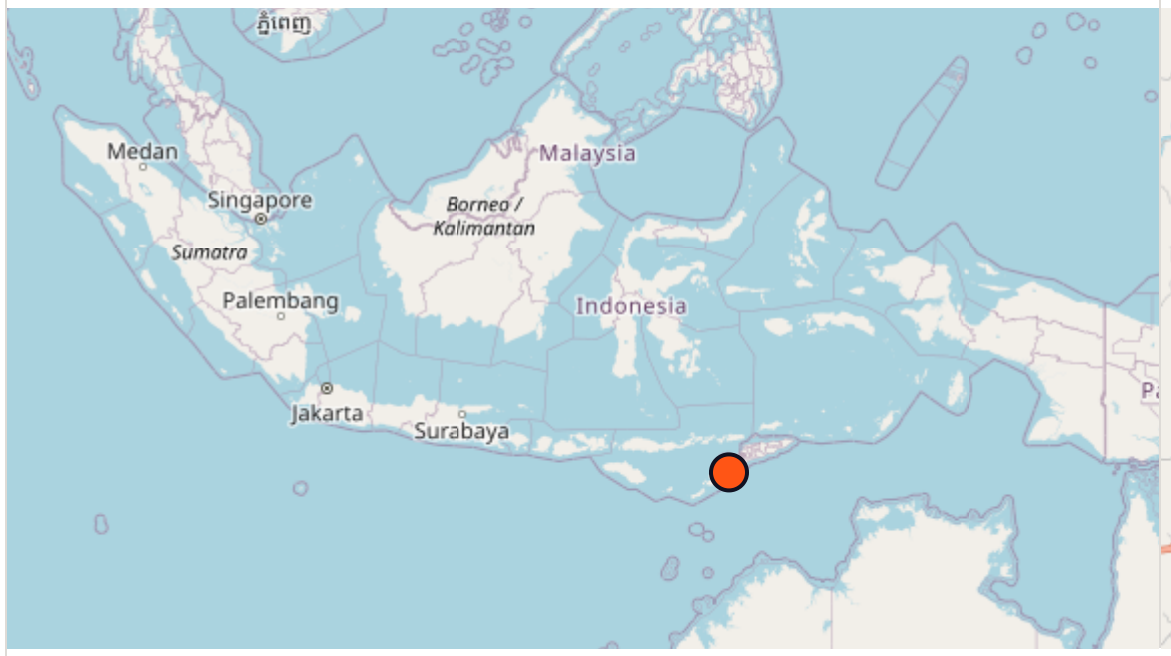

② **사업 마을 확대** 보네 오에투네 마을 주변



사업지역 동누사텡가라(East Nusa Tenggara)주 남중부 티모르(South Central Timor) 아마누반텡가(Amanuban Tengah)구 보네 오에투네(Bone-Oetune) 마을 [1]

지도의 점은 OpenStreetMap에 등록된 보네(Bone) 마을 위치로, 실제 사업 시설 위치와는 조금 다를 수 있습니다. [5]

사업이 이루려는 두 가지 목표

01

세부 목표 1

안전한 식수 접근성 향상

1. 사업대상지역 실태조사 및 주민참여형 사업 설계
2. 식수시설 설치
3. 식수관리위원회 구성 및 구성원 역량강화
4. 정기 모니터링 및 수원지 보호 활동

02

세부 목표 2

지역사회 위생관리 강화

1. 위생 인식 개선 캠페인 및 야외배변근절(ODF) 인식 교육
2. 야외배변근절 모니터링 및 마을 인증 절차 지원
3. 가정 내 간이 손씻기 시설 설치


02 · 안전한 식수 접근성 향상

수원지에서 집 앞까지, 물길을 잇는 여섯 단계

수원지의 물을 모아 거르고, 태양광으로 움직이는 펌프로 높은 저수조까지 끌어올린 뒤, 각 가정으로 나눠 보냅니다. 현재까지 다섯 단계를 주민들과 함께 진행했고, 가정 연결은 남은 사업기간 안에 마칠 예정입니다. [1] [3]

식수 시스템 흐름도

완료 예정

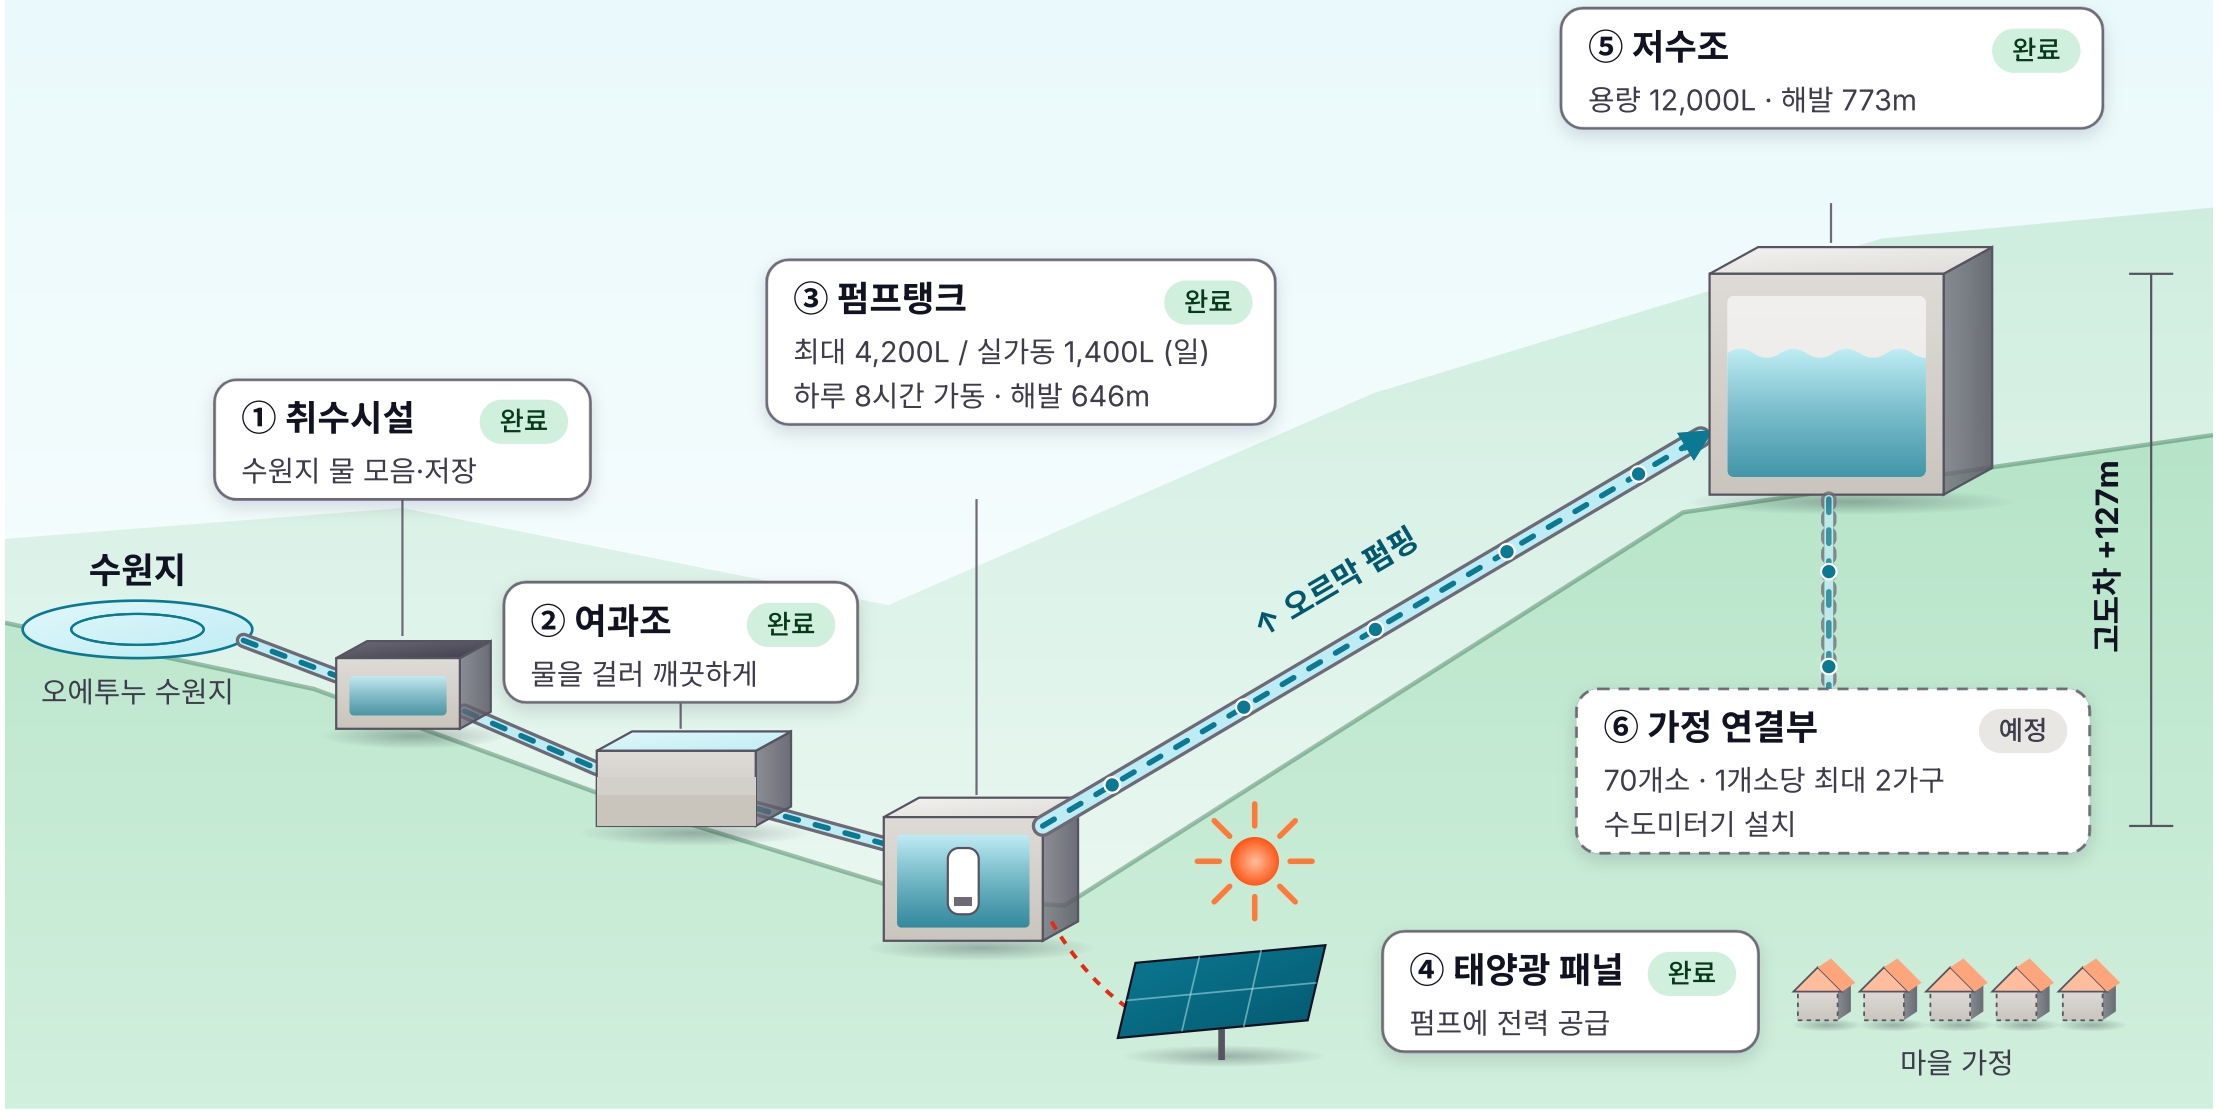

시설 용량과 해발은 설계 기준 값입니다. [3]

1 취수시설
Broncaptering — 완료

수원지(오에투누 수원지)의 물을 모아 저장합니다.

수질검사 결과에 따라 시설을 청소하고 지붕을 설치해, 낙엽과 동물 배설물이 수원에 직접 들어가지 않도록 했습니다.

2 여과조
Water Filtration — 완료

모은 물을 걸러 깨끗하게 만듭니다.

주민들의 참여로 여과조를 건설했습니다.

3 펌프탱크
Pump Tank — 완료

수중 펌프로 물을 저수조까지 끌어올립니다.

펌프탱크를 건설하고 수중 펌프와 계량기를 설치했습니다.

4 태양광 패널
Solar Panel — 완료

펌프를 움직이는 전력을 만듭니다.

태양광 패널을 설치했습니다.

5 저수조
Reservoir — 완료

끌어올린 물을 저장해 마을로 내려보냅니다.

저수조를 건설하고 배관을 깔아 통수 실험을 진행했습니다.

6 가정 연결부
Household Connection — 예정

마을 가정까지 물을 나눠 보냅니다.

배급망과 가정 연결, 정수 시스템 설치는 자재 조달 지연으로 남은 사업기간 안에 완료할 예정입니다.

70 개소 설치 예정 [3]

수원지 보호와 수질 관리

① 취수시설의 지붕과 정수 필터는 수질검사 결과에 따른 조치입니다.

확인한 문제

2026년 6월 수질검사에서 대장균과 총대장균군이 높게 나타났습니다.

조치

정수 필터를 설치하고, 취수시설을 청소한 뒤 지붕을 설치했습니다.

다음 단계

조치 효과를 확인하기 위해 추후 수질을 다시 검사할 예정입니다.

출처: 중간보고서 [1]

시설별 공사 과정 사진은 [현장 기록]에서 볼 수 있습니다 ›

03 · 지역사회 위생관리 강화

마을 지도자들의 위생 역량을 높입니다

위생 교육을 받은 마을 지도자

62명

지역 마을 지도자 [1]

지역 마을 지도자 62명(여 36명, 남 26명)에게 지역사회 위생 상태 점검 방법과, 가정에서 실천할 수 있는 물 정화·소독·안전한 저장 방법을 교육했습니다.

이어지는 활동

교육을 받은 마을 지도자들은 각 마을에서 주민들과 함께 위생 문제를 살펴보고, 화장실 사용을 독려하며, 가구별 위생 및 화장실 보유 현황을 확인할 예정입니다.

04 · 진행 현황

사업 진행 현황

7개 활동



01 안전한 식수 접근성 향상

1-1 사업대상지역 실태조사 및 주민참여형 사업 설계

완료

1-2 식수시설 설치

진행 중

진행한 일

- 펌프탱크·여과조·저수조 건설
- 태양광 패널·펌프 설치
- 배관 부설, 저수조 통수 실험

다음 단계

- 배급망·가정 연결·정수 시스템 설치

1-3 식수관리위원회 구성 및 구성원 역량강화

예정

다음 단계

- 상수도 공사 완료 후 시설 운영·유지보수를 맡을 위원회 구성

1-4 정기 모니터링 및 수원지 보호 활동

진행 중

진행한 일

- 6월 수질검사
- 정수 필터 설치
- 취수시설 청소·지붕 설치

다음 단계

- 수질 재검사
- 물 분배 상태·시스템 성능 매주 모니터링

02 지역사회 위생관리 강화

2-1 위생 인식 개선 캠페인 및 야외배변근절 (ODF) 인식 교육

진행 중

진행한 일

- 마을 지도자 62명 대상 식수위생 교육

다음 단계

- 마을별 주민 위생 점검
- 화장실 사용 독려
- 가구별 위생, 화장실 현황 확인

2-2 야외배변근절 모니터링 및 마을 인증 절차 지원

예정

다음 단계

- 하반기 진행 예정

2-3 가정 내 간이 손씻기 시설 설치

예정

다음 단계

- 하반기 진행 예정

26년 9월 기준 · 중간보고서 [1]

예산 집행 현황

사업 종료까지 예산을 전액 집행 예정입니다

총 사업 예산

80,000,000 원

● 집행 완료 (22.6%)

18,112,875 원

● 하반기 집행 예정 (77.4%)

61,887,125 원

22.6% 12월 사업 종료 시 100%

01

공사비는 완공 후 지급

사업비의 상당 부분이 식수시설 공사비이고, 공사비는 시설이 완공된 뒤 지급합니다.

02

하반기 공사 최종 완료에 맞춰 집행

배급망·가정 연결 공사가 마무리되는 대로 남은 예산이 집행됩니다.

03

2026년 12월까지 전액 집행 예정

사업 종료 시점까지 계획한 예산을 모두 집행할 예정입니다.

26년 9월 기준 · 원화 기준 · 집행률은 집행 금액을 총 예산으로 나눈 값 [1]

05 · 현장 기록

주민들과 함께 지은 식수 시설

시설별 공사 과정을 순서대로 모았습니다. 사진을 누르면 크게 볼 수 있으며, 다운로드가 가능합니다. [4]

취수시설 사진 2



지붕 설치 전 취수시설



지붕을 설치한 취수시설(Broncaptering)

여과조 사진 2



여과조 설치 과정



여과조에서 물이 정수되는 모습

펌프탱크 사진 4



펌프탱크 설치 장소의 기초 굴착



주민들이 함께 철근을 세우는 모습



완성되어 가는 펌프탱크



완공된 펌프탱크

펌프 사진 3



펌프탱크 안에 설치하는 수중 펌프



수중 펌프가 설치된 펌프탱크



펌프 계량기

태양광 패널 사진 3



태양광 패널 받침대 설치



태양광 패널 설치 과정



설치를 마친 태양광 패널

저수조 사진 3 · 영상 1



저수조 바닥 위에 철근을 세우는 모습



나무판자로 저수조 틀을 만드는 모습



주민들이 함께 시멘트를 붓는 모습

ⓘ 사진은 크게 본 화면에서 내려받을 수 있습니다. **대외 활용(홍보, 보도, SNS 등) 시에는 월드비전과 사전 협의가 필요합니다.**

06 · 기대 효과

깨끗한 물이 가져올 변화

사업 이후 기대되는 변화를 지속가능발전목표(SDGs)에 맞춰 정리했습니다.[1]

이 사업이 기여하는 SDGs 목표

6 SDG 6 깨끗한 물과 위생

- 안전한 식수 공급망 구축과 가정 단위 물 접근성 향상
- 기본 위생시설 개선과 위생 실천 강화
- 지역 기반 식수위생 운영·관리체계 구축과 유지관리 역량 강화

3 SDG 3 건강과 웰빙

- 수인성 질병 감소를 통한 아동 건강 개선
- 발육부진(stunting) 예방과 영양 지표 향상
- 위생환경 개선을 통한 질병 부담 완화

5 SDG 5 성평등

- 물 긷기와 위생 관련 부담이 줄어 여성·여아의 일상적 제약 완화

SDGs(지속가능발전목표)는 유엔이 2030년까지 이루기로 정한 17가지 목표입니다. 목표 이름과 색상: 유엔 SDGs [6]

1 빈곤 퇴치	2 기아 종식	**3 건강과 웰빙**	4 양질의 교육	**5 성평등**	**6 깨끗한 물과 위생**	7 모두를 위한 깨끗한 에너지	8 양질의 일자리와 경제성장	9 산업, 혁신, 사회기반시설
10 불평등 감소	11 지속가능한 도시와 공동체	12 책임감 있는 소비와 생산	13 기후변화 대응	14 해양 생태계 보전	15 육상 생태계 보전	16 평화, 정의, 강력한 제도	17 목표를 위한 파트너십	

07 · 향후 계획

마지막 분기는 이렇게 계획합니다

Q4

2026년 10~12월

남은 사업기간 안에 시설 공사를 마무리하고, 운영·위생 활동을 이어갑니다.

2026년 12월 사업 종료

남은 사업기간 내

배급망·가정 연결(70개소)·정수 시스템 설치 완료

11월 중 예정

식수시설에 후원 판넬 부착

추후

정수 필터와 취수시설 보호 조치의 효과를 확인하는 수질 재검사

공사 완료 후

시설 운영과 유지보수를 맡을 식수관리위원회 구성

남은 사업기간 내

물 분배 상태와 시스템 성능 정기 모니터링

남은 사업기간 내

마을별 주민 위생 점검, 화장실 사용 독려, 야외배변근절 모니터링, 가정 내 간이 손씻기 시설 설치

노스페이스 에디션께

함께 변화를 만들어 주셔서 감사합니다.

2026 인도네시아 티모르지역 식수위생 지원사업

World Vision

2026 인도네시아 티모르지역 식수위생 지원사업

자료 기준

[1] FY26 인도네시아 티모르 식수위생 지원사업 중간보고서 · 월드비전 작성.

[2] 수혜자 수 정정 (사업 담당자 확인) · 2026년 11월 5일 확인. 총 수혜자 6,275명 = 직접수혜자 653명 + 간접수혜자 5,622명. 직접수혜자 구성은 중간보고서 기준.

[3] 식수 시스템 건설 계획도 · 중간보고서 4쪽. 시설 용량·해발·가정 연결부 수는 설계 기준 값.

[4] 현장 사진 (1·2분기) · 월드비전 현장 제공 사진. 파일명의 활동 설명을 캡션으로 사용.

[5] OpenStreetMap 지명 검색 (보네 마을, 남중부 티모르) · 지도 위치 표시에만 사용. 2026년 11월 4일 조회. 지도 바탕 © OpenStreetMap contributors.

[6] 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 17개 목표 · sdgs.un.org/goals. 목표 이름과 공식 색상.

지표 기준

직접 수혜 대상은 사업 계획에 적힌 직접수혜자 수이며, 사업 종료 후 실제 수혜 인원과 다를 수 있습니다.

총·간접 수혜자 수는 2026년 11월에 확인한 값이고, 그 밖의 수치는 2026년 9월(중간보고) 기준입니다.

사진과 영상

월드비전 사업 현장 기록입니다. 대외 활용(홍보, 보도, SNS 등) 시에는 월드비전과 사전 협의가 필요합니다.
